


8月 4F柱牆-5FL樑版



4F柱牆模板組立

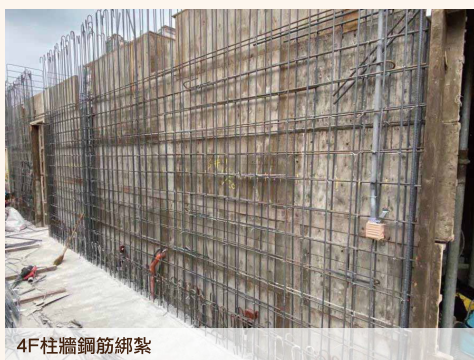


4F柱牆鋼筋綁紮

八月上開始進行4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立。

8月 4F柱牆-5FL樑版



5FL樑版模板組立

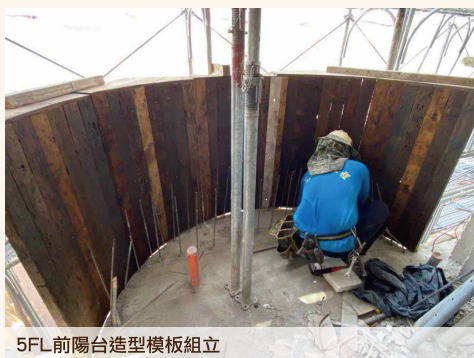

5FL前陽台造型模板組立

八月上開始進行4F柱牆鋼筋綁紮及模板組立。

8月 4F柱牆-5FL樑版



塔吊安裝完成



5FL樑版鋼筋綁紮

八月中旬完成塔吊機具安裝，
後續材料吊運更為安全與方便。

8月 4F柱牆-5FL樑版



4F柱牆、5FL樑版混凝土澆置(8/3)



4F柱牆、5FL樑版混凝土澆置完成(8/3)

八月下旬進行4F柱牆及5FL樑版混凝土澆置。

8月 4F柱牆-5FL樑版



上層結構體持續施作外，
地下室也開始進行內牆打底粉光及天花板批土。
