


4月 1F柱牆-1ML樑版(1/3)



鷹架搭設

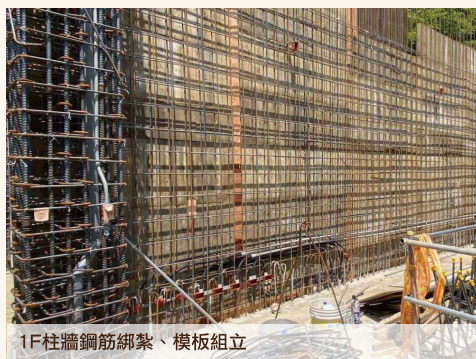


1F柱牆鋼筋綁紮、模板組立

開始進行1F柱牆作業，
配合施工需求搭設鷹架以利昇柱筋、
組立1F柱牆模板及鋼筋綁紮。

4月 1F柱牆-1ML樑版(2/3)



1F柱牆水電配管

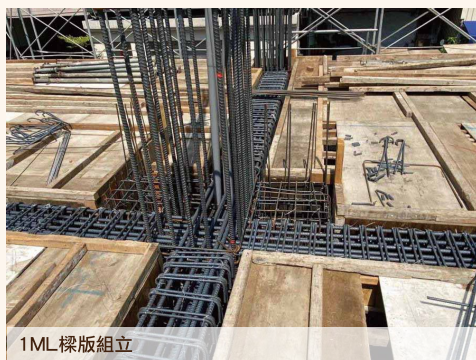

1ML樑版組立

1F柱牆水電配管完成後與圖面查核確認，
並針對各處進行拍照紀錄，
柱牆完成後進行店舖夾層(1ML)樑版施作。

4月 1F柱牆-1ML樑版(3/3)



1ML樑版鋼筋綁紮



1F柱牆-1ML樑版混凝土澆置

1ML樑版鋼筋綁紮、
水電配管完成，依序安排1ML樑版混凝土澆置。

5月 1MF柱牆-1F店舖頂板(1/2)



1MF柱牆鋼筋綁紮



1F店舖頂板、2FL模版組立



1MF樑版完成後，進行1MF柱牆鋼筋綁紮及模板組立。
五月中旬完成1F店舖頂板模板組立，已可看出店舖的雛形。

5月 1MF柱牆-1F店舖頂板(2/2)



五月下旬進行1F頂板鋼筋綁紮及水電配管。
五月底完成1F店舖頂板混凝土澆置，
並施作整體粉光避免龜裂。

6月上中旬 2FL樑版

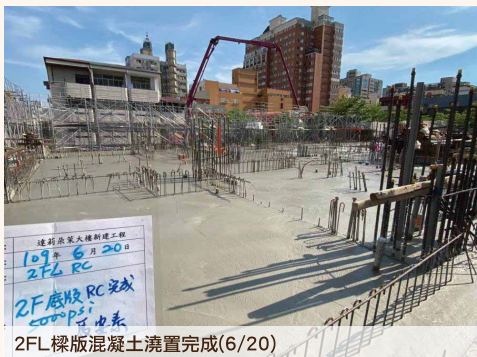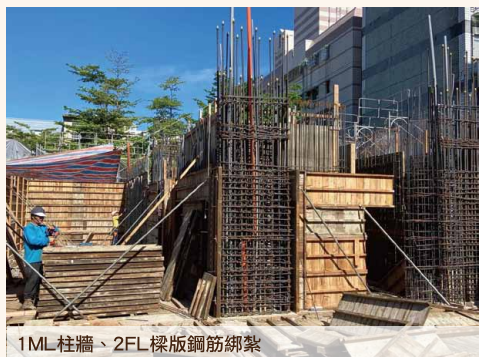

1F店舖頂板完成後，接續施作1ML柱牆及2FL樑版。
6月中旬完成2FL樑版混凝土澆置。
