

# 9月上旬 5F柱牆-6FL樑版



BF牆面打底粉光



BF天花板、牆面批土完成

上層結構體持續施作外，  
地下室也同步進行裝修工程，  
施作內牆打底粉光及天花板批土。

# 9月上旬 5F柱牆-6FL樑版



5F牆面模板組立




5F柱牆鋼筋綁紮

九月上旬開始施作5F柱牆模板組立及鋼筋綁紮。

# 9月上旬 5F柱牆-6FL樑版



6FL 樑版模板組立

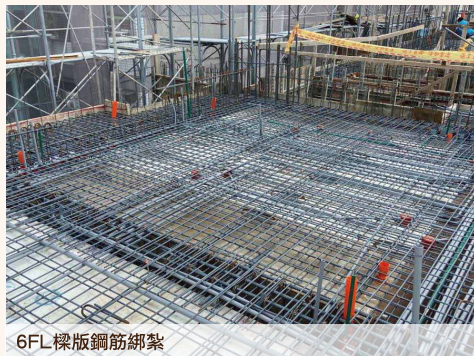

6FL 樑版鋼筋綁紮

九月中旬施作6FL樑版模板組立及鋼筋綁紮。

# 9月中旬 5F柱牆-6FL樑版



5F柱牆、6FL 樑版混凝土澆置(8/3)



5F柱牆、6FL 樑版混凝土澆置完成(8/3)

九月中旬進行5F柱牆及6FL樑版混凝土澆置。
