

9月下旬 6F柱牆-7FL樑版



BF天花板清水模打磨



BF天花板、牆面油漆完成

地下室同步進行地下室天花板、牆面油漆。

9月下旬 6F柱牆-7FL樑版



鋁窗電焊立框



鋁窗電焊立框完成

樓下已完成樓層亦同步開始進行鋁窗安裝，
每一扇窗皆以精密儀器確實校正後安裝。

9月下旬 6F柱牆-7FL樑版



6F柱立牆模



6F柱牆模板組立

九月下旬上層結構體持續施作，
鋼筋綁紮、模板組立按部就班進行中。

9月下旬 6F柱牆-7FL樑版



7FL樑版模板組立




7FL樑版鋼筋綁紮

九月下旬上層結構體持續施作，
鋼筋綁紮、模板組立按部就班進行中。

10月上旬 6F柱牆-7FL樑版混凝土澆置



6F柱牆、7FL樑版混凝土澆置(10/8)

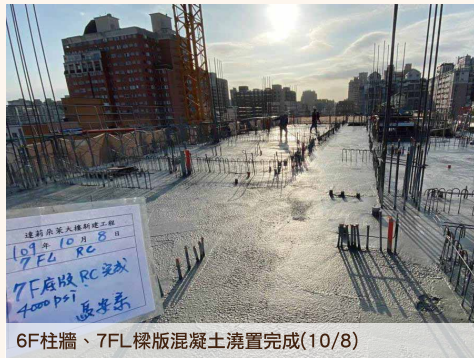

6F柱牆、7FL樑版混凝土澆置完成(10/8)

十月上旬進行6F柱牆、
7FL樑版混凝土澆置，結構體進度已超過一半。
