

8月上旬 PC澆置完成



基礎開挖整地(8/3-8/7)



PC澆置(8/7)

8月初正式動工，基礎開挖整地開始
經過一週的時間完成基礎開挖及PC混凝土澆置

8月上旬 基礎大底RC澆置完成



基礎鋼筋綁紮(8/12-15)
模板組立(8/17-18)



基礎大底RC澆置(8/19)

案名：達利香榭
日期：109.08.19
稱重：基礎大底RC-300psi
檢驗人員：陳映谷
8/19

PC澆置完成後依施工圖面進行放樣，依據放樣位置開始基礎鋼筋
綁紮與模板組立，完成後進行基礎大底混凝土澆置與養護

8月下旬 基礎地樑完成(1/2)



基礎地樑模板組立(8/21-8/25)




基礎地樑RC澆置(8/26)

基礎大底完成後，進行基礎地樑模板工程
並接續完成基礎地樑混凝土澆置

8月下旬 基礎地樑完成(2/2)



基礎地樑模板拆除、養護
(8/27-9/3)

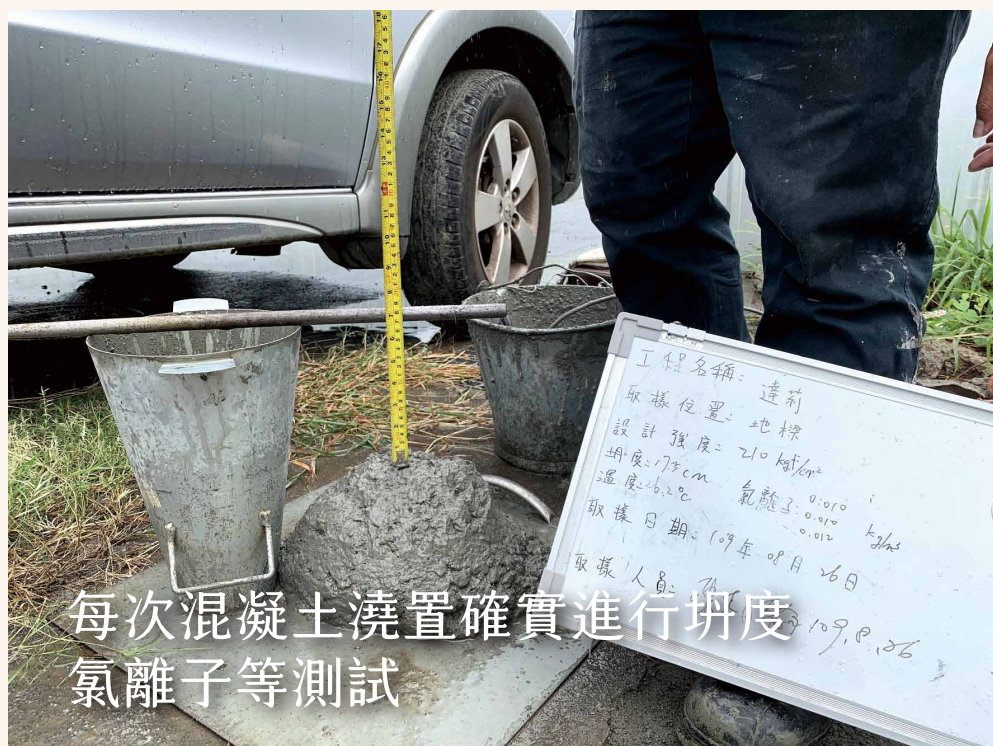

每次混凝土澆置確實進行坍度
氯離子等測試

基礎地樑模板拆除後，可看見完整、
安全又美觀的筏式基礎，並進行基礎地樑養護
