


10月上旬 前院地坪澆置完成



前院開挖整地進行中(10/5)

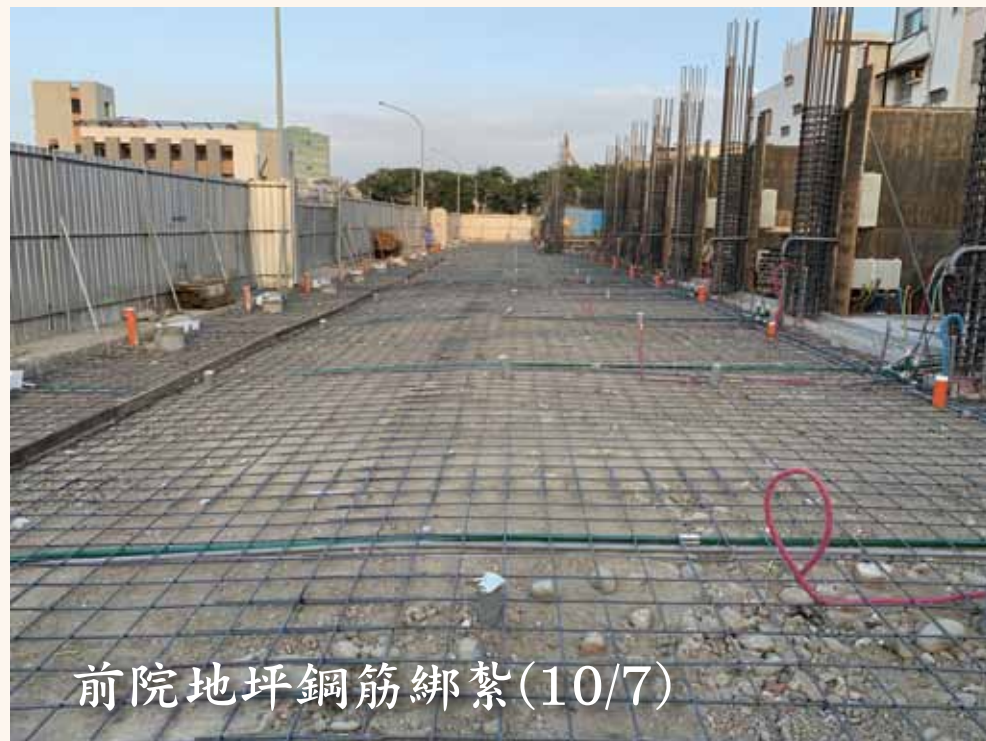

前院地坪鋼筋綁紮(10/7)

為利於後續施作動線、物料放置與環境整潔，先行施作前院地坪。
污廢水陰井設置完成後進行前院整地，並依序配置給水、
瓦斯管線與地坪鋼筋綁扎。

10月上旬 前院地坪澆置完成



前院地坪混凝土澆置(10/9)



前院地坪澆置後養護(10/9)

前院地坪高程核對與水電、瓦斯線配管完成後，
進行地坪混凝土澆置及養護。

10月 1F柱牆-2FL樑版(1/3)



1F升柱筋、污廢水管



1F牆面單面模板組立

前院地坪整地期間，同步進行1F升柱筋及單面模板組立。

10月 1F柱牆-2FL樑版(2/3)



1F柱牆鋼筋綁扎




1F柱牆封模

水電依據客戶變更圖面按圖放樣施工，接續進行1F柱筋綁扎。
鋼筋綁扎及水電配管完成後，逐戶檢核及拍照紀錄並陸續封模。

10月 1F柱牆-2FL樑版(3/3)



2FL模板組立

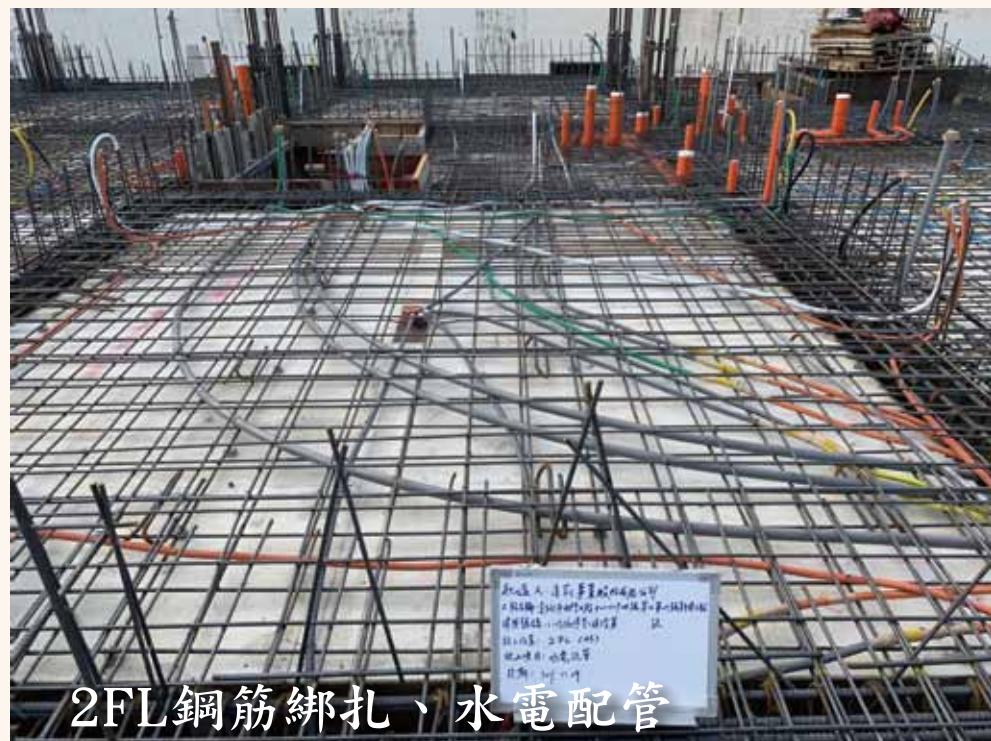

2FL鋼筋綁扎、水電配管

封模完成後，開始進行2FL板鋪設，並接續進行地坪鋼筋綁扎及水電配管。

11月上旬 1F柱牆-2FL樑版澆置



2FL混凝土澆置(11/9)



2FL地坪養護

11月上旬進行1F柱牆及2FL樑版混凝土澆置，澆置完成並安裝自動灑水設施進行混凝土養護。
