


11月中旬 2F柱牆-3FL樑版




11月中旬升2F鷹架、柱筋及污廢水管，接續進行單面模板組立。

11月下旬 2F柱牆-3FL樑版

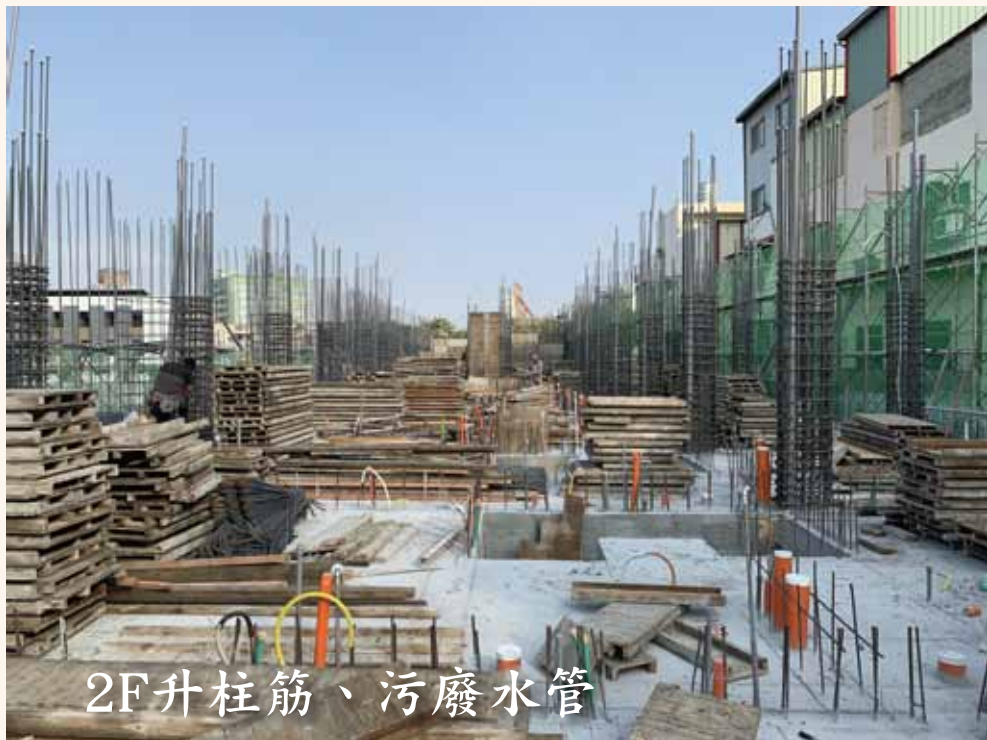

11月下旬施作2F牆水電配管、鋼筋綁扎。

12月上旬 2F柱牆-3FL樑版

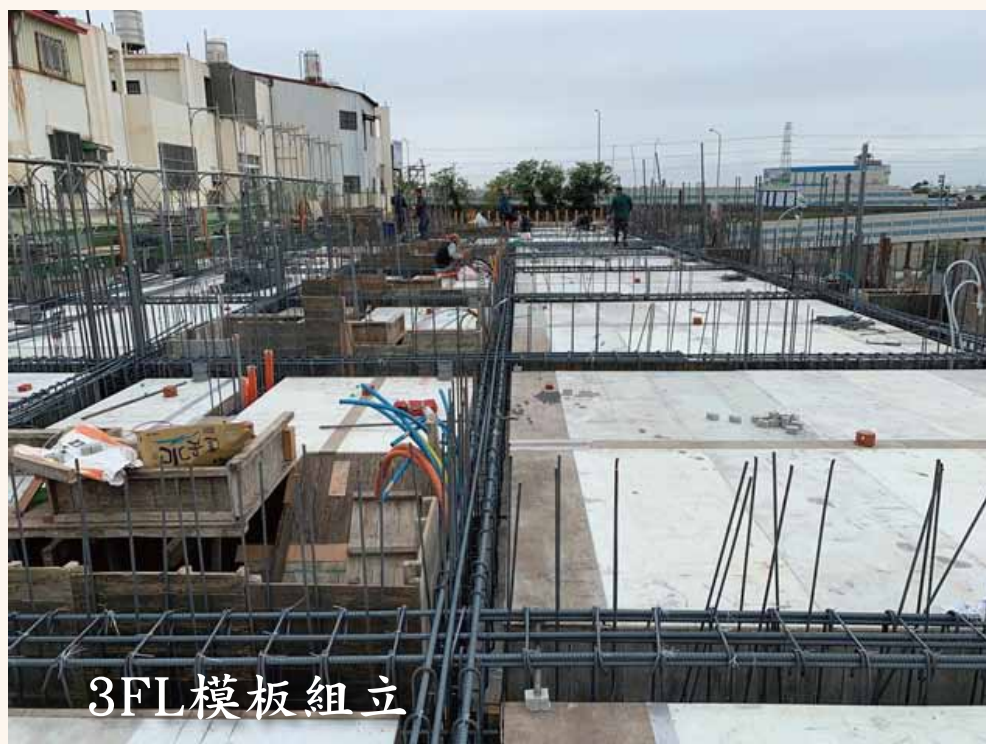

3FL模板組立



3FL鋼筋綁扎、水電配管

12月上旬施作3FL樑版模板組立、水電配管及鋼筋綁紮。

12月中旬 2F柱牆-3FL樑版澆置



3FL混凝土澆置(12/15)



混凝土確實抽樣製作試體

12月中旬進行2F柱牆、3FL樑版混凝土澆置。
