

12月下旬 3F柱牆-4FL樑版




3F柱牆模版、水電放樣




3F昇柱筋、污廢水管

十二月下旬進行3F柱牆模版施工放樣
升3F鷹架、柱筋及污廢水管

1月上旬 3F柱牆-4FL樑版

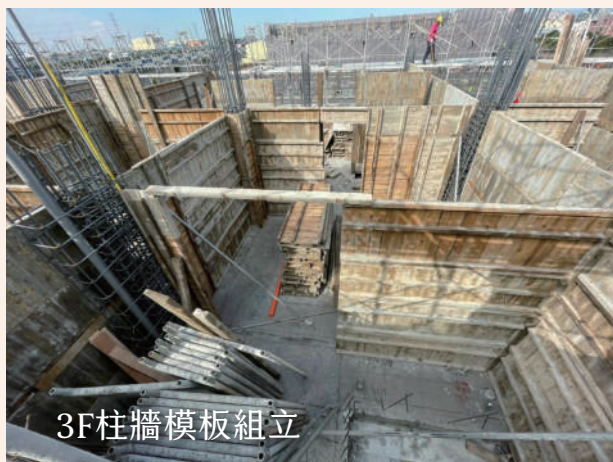

3F柱牆模板組立

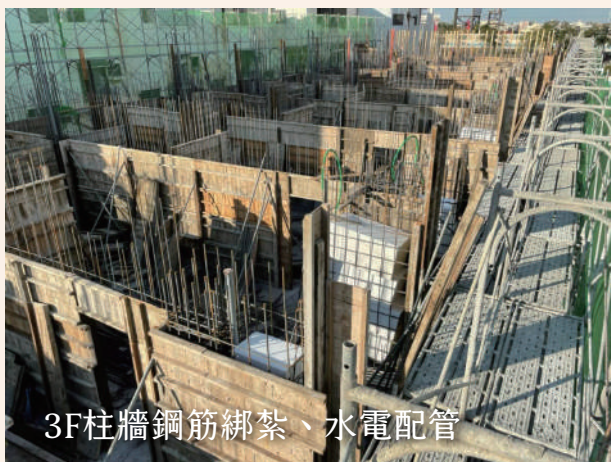


3F柱牆鋼筋綁紮、水電配管

一月上旬進行3F柱牆模板組立、鋼筋綁紮

1月中旬 3F柱牆-4FL樑版




3F柱牆模板組立

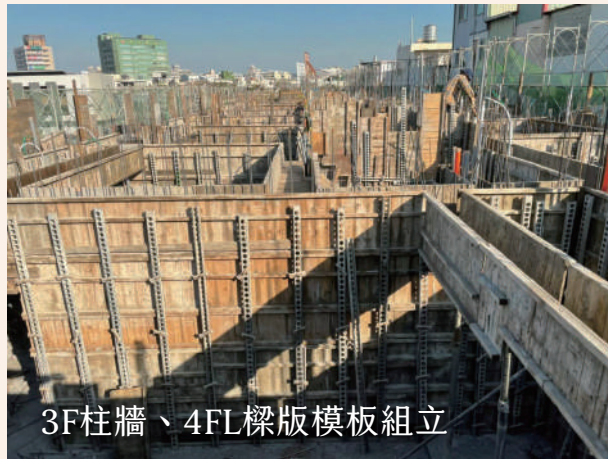

3F柱牆、4FL樑版模板組立

一月上旬進行3F柱牆鋼筋綁扎、水電配管、模版封模

1月下旬 3F柱牆-4FL樑版

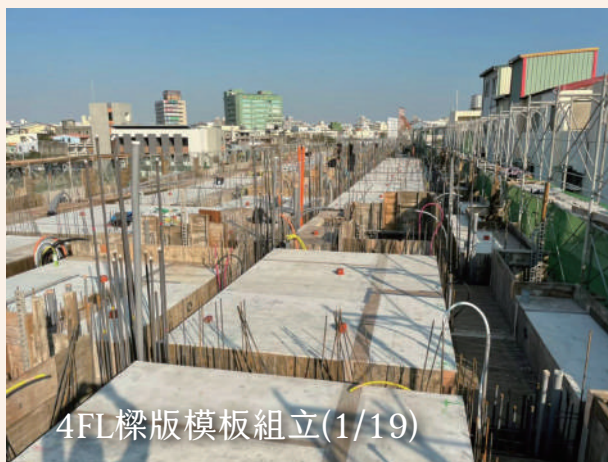


4FL樑版模板組立(1/19)



4FL樑版鋼筋綁紮(1/31)

一月下旬施作4FL樑版模板組立、水電配管及鋼筋綁紮

2月上旬 3F柱牆-4FL樑版澆置

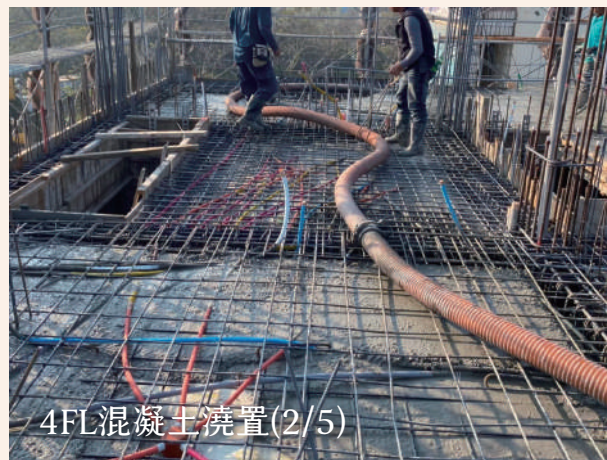

二月上旬進行3F柱牆、4FL樑版混凝土澆置
